

Terrasond Kampfmittelräumung GmbH
Shelterschleife 20
89340 Leipheim
Tel. 08221 / 96495-10
Fax. 08221 / 96495-20
eMail: info@terrasond-eod.de

Leipheim den:

23.07.2021

Arbeitsbericht über durchgeführte Maßnahmen der Kampfmittelerkundung


- | | |
|--|--|
| 1. Ausführende Firma: | TERRASOND Kampfmittelräumung GmbH |
| 2. Auftraggeber: | mquadrat Erschließungsträger GmbH |
| 3. unsere Auftragsnummer: | 2020-0741 |
| 4. Ausführungsort / Gelände: | 73061 Ebersbach an der Fils, Roßwälden |
| 5. Ausführungszeitraum: | 12.07.2021 |
| 6. Anlaß der Maßnahmen: | Baugebiet Untere Morgen |
| 7. vermutete Kampfmittel: | Bombardierung des Geländes im 2.WK,
ferromagnetische Munition jeglicher Art |
| 8. Art der Kampfmittelerkundung: | Nachgrabung der Dokumentierten Einzelverdachtspunkte |
| 9. Verwendete Sonde: | 1 Kanal Vallon VX1 |
| 10. Verwendete Auswertungssoftware: | Vallon EVA2000® |
| 11. Ausführungsbereiche / Bohransatzpunkt(e) | bombardierter (rot schraffierter) Bereich
gemäß Luftbildauswertung 01.07.2020 LBA |
| 12. Ergebnisse der Kampfmittelerkundungsmaßnahmen: | Keine Munitionsfunde. Auffinden von Munitionsschrott.
Hindernisse vor Ort waren Bewuchs, Bebauung, Asphalt. |
| 13. Freigabe für die Flächen / Punkte | Siehe Freigabeplan |
| 14. Bemerkungen / Hinweise für den Auftraggeber: | Da verschiedene nicht ferromagnetische Leitungen wie zb.Kupfer, Aluminium, Plastik, Glasfaserkabel usw. nicht von der Sonde erfasst werden können, ist eine Freigabe dafür nicht möglich.
Rot schraffierte Bereiche müssen weitehrin auf Kampfmittel untersucht werden. |

Die Maßnahmen der Kampfmittelerkundung wurden nach derzeitigen Stand der Technik durchgeführt.

Feuerwerker auf der Räumstelle
R. Steinecke

Verantwortlicher Feuerwerker
A. Wagner, i.A. D. Brademann

Anlagen: Freigabeplan, Fundliste, Tagesbericht (bei der Rechnung)

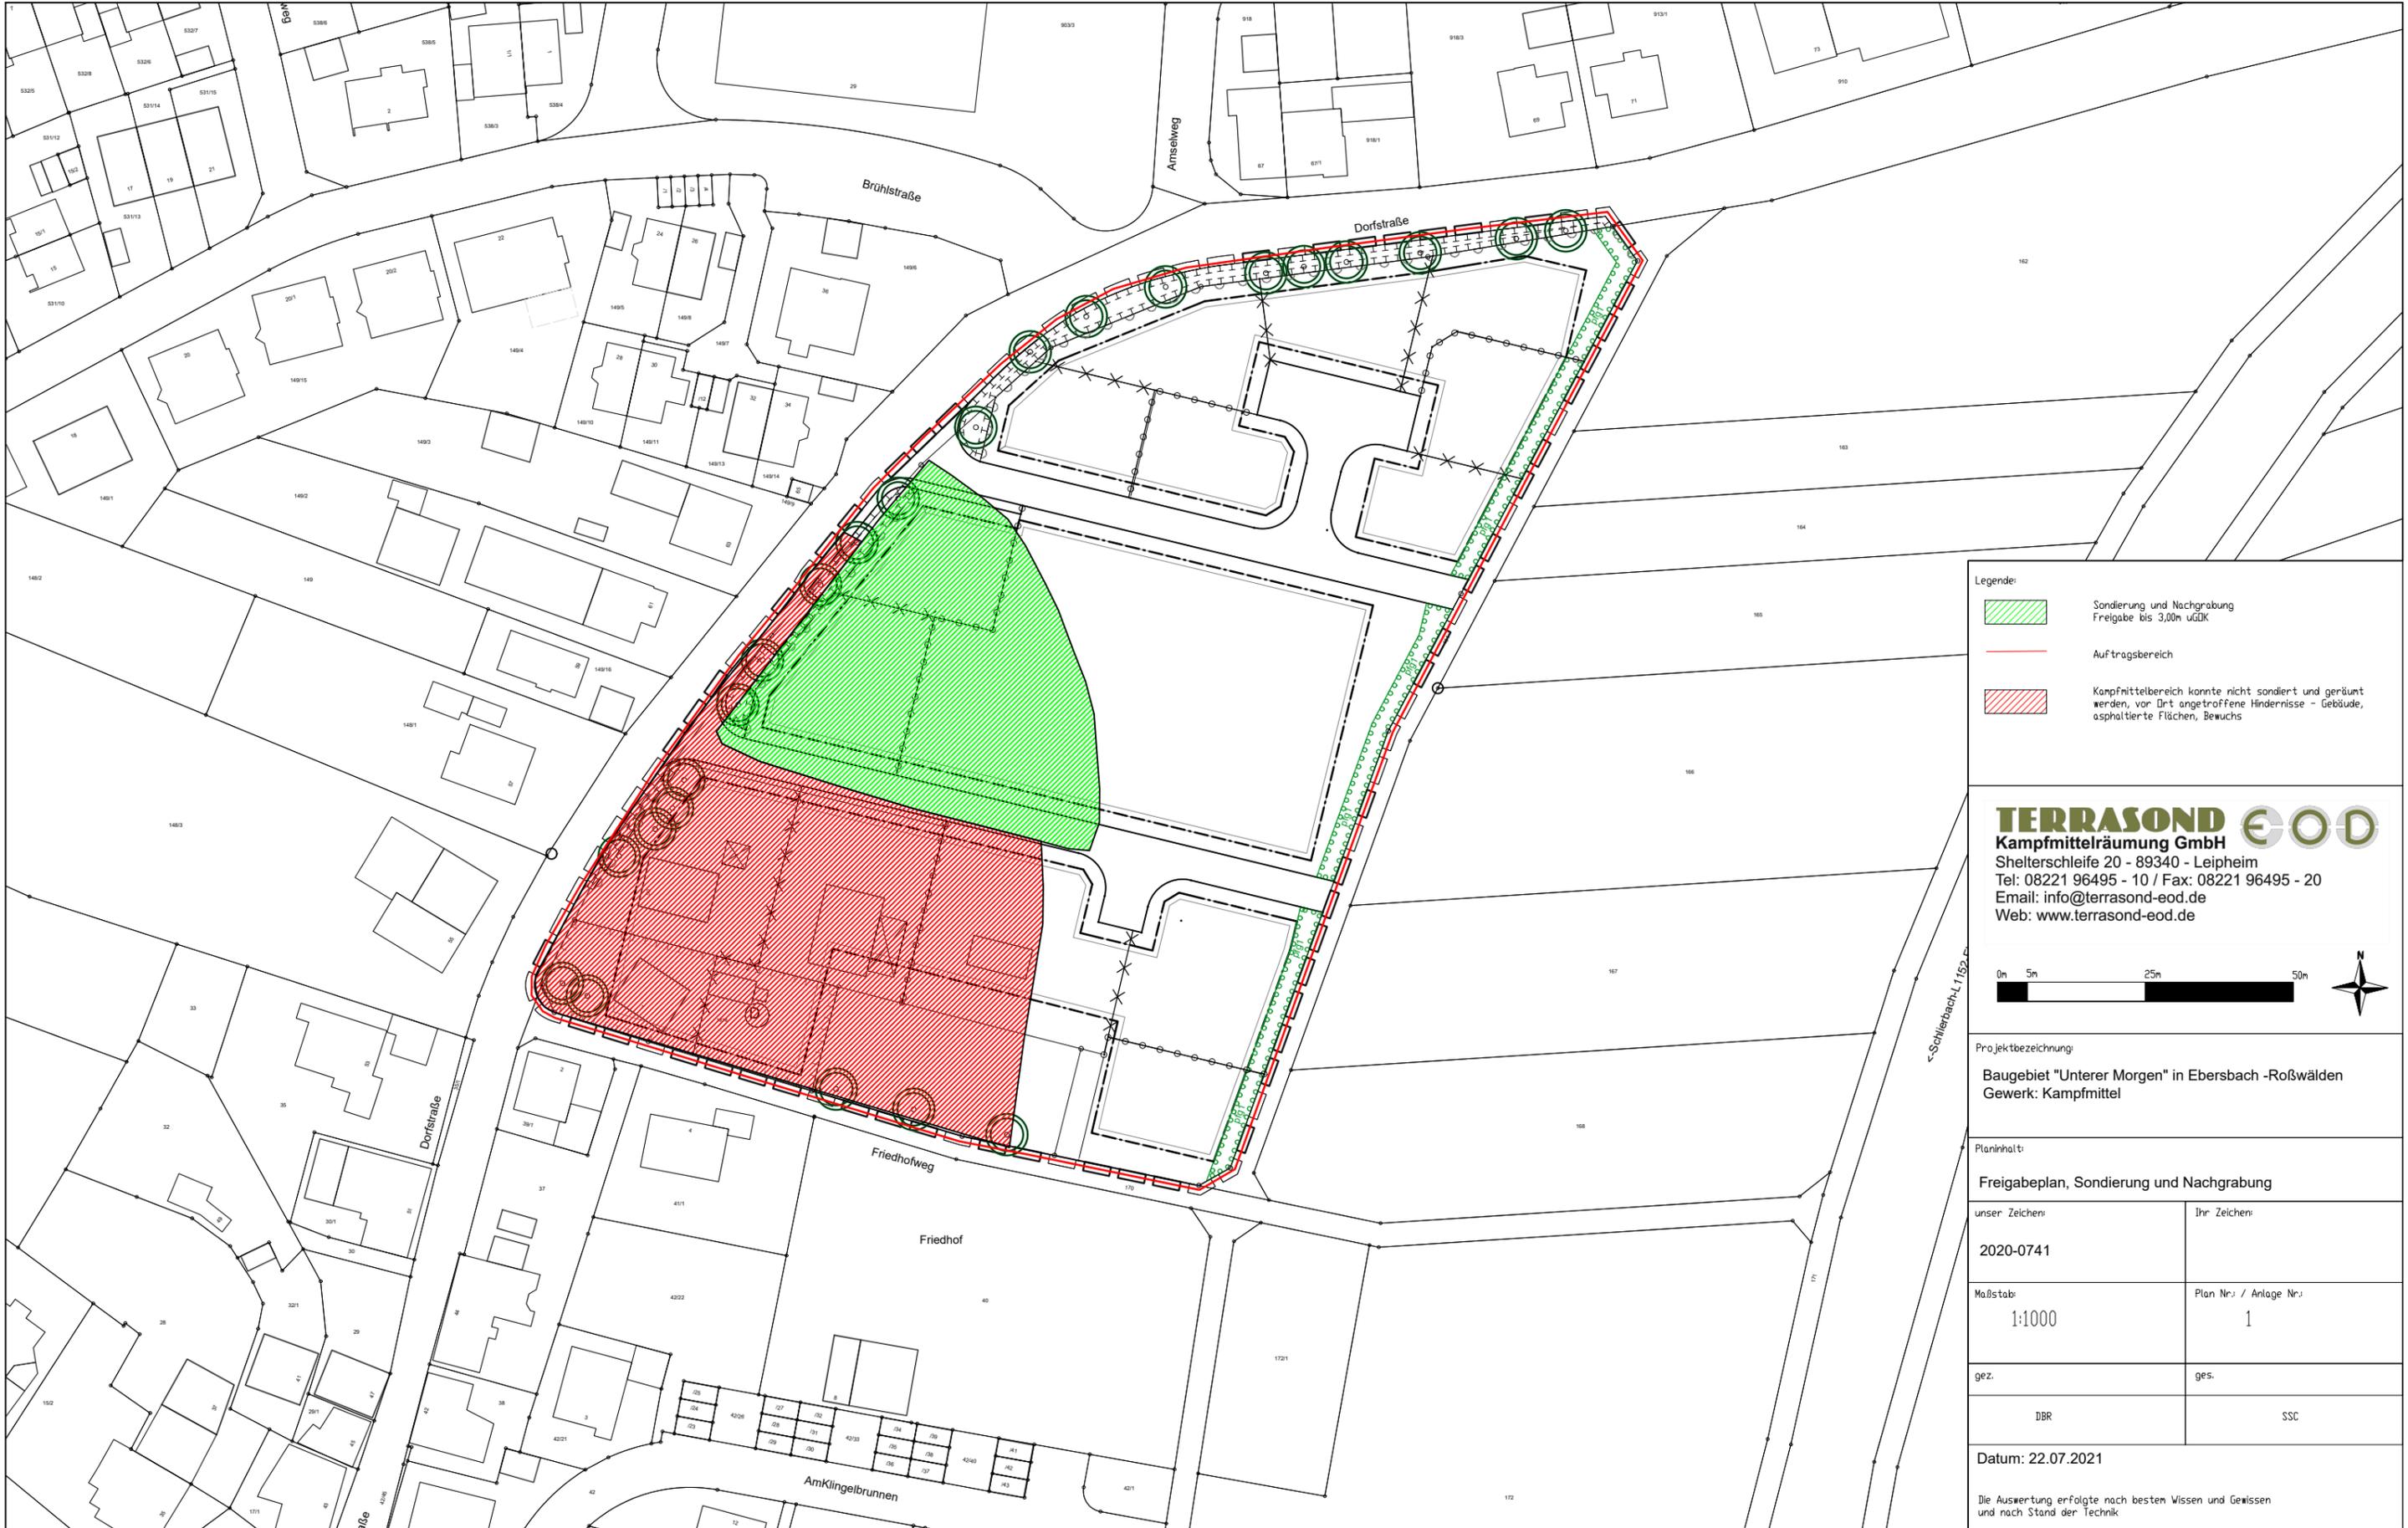

- Legende:
- Sondierung und Nachgrabung
Freigabe bis 3,00m uGDK
 - Auftragsbereich
 - Kampfmittelbereich konnte nicht sondiert und geräumt werden, vor Ort angetroffene Hindernisse - Gebäude, asphaltierte Flächen, Bewuchs

TERRASOND EOD
Kampfmittelräumung GmbH
 Shelterschleife 20 - 89340 - Leipheim
 Tel: 08221 96495 - 10 / Fax: 08221 96495 - 20
 Email: info@terrasond-eod.de
 Web: www.terrasond-eod.de



Projekthezeichnung:
Baugebiet "Unterer Morgen" in Ebersbach -Roßwälden
 Gewerk: Kampfmittel

Planinhalt:
Freigabeplan, Sondierung und Nachgrabung

unser Zeichen: 2020-0741	Ihr Zeichen:
Maßstab: 1:1000	Plan Nr.: / Anlage Nr.: 1
gez. DBR	ges. SSC

Datum: 22.07.2021
 Die Auswertung erfolgte nach besten Wissen und Gewissen und nach Stand der Technik

Steuerung	V 1 2020	Verfasser:	Stefan Schiessl
Dokument	Fotodokumentation	Freigabe:	Denny Brademann
Projekt: Ebersbach-Roßwälden, Baugebiet "Unterer Morgen"			
Projektnummer TS: 2020-0741		Projektnummer AG:	



Kurzbeschreibung: Punkt 25 auf Asphalt - konnte nicht geräumt werden
 Aufnahmedatum: 12.07.2021



Kurzbeschreibung: Punkt 29 auf Asphalt - konnte nicht geräumt werden
 Aufnahmedatum: 12.07.2021

Steuerung	V 1 2020	Verfasser:	Stefan Schiessl
Dokument	Fotodokumentation	Freigabe:	Denny Brademann
Projekt:	Ebersbach-Roßwälden, Baugebiet "Unterer Morgen"		
Projektnummer TS:	2020-0741	Projektnummer AG:	0



Kurzbeschreibung: Punkt 24 auf Asphalt - konnte nicht geräumt werden
 Aufnahmedatum: 12.07.2021



Kurzbeschreibung: Punkt 18 und 19 Zaunalage
 Aufnahmedatum: 12.07.2021

2020-0741 - NeuesFeld

12.07.2021



Dienstleister: TERRASOND Kampfmittelräumung GmbH

Bearbeiter:

Datenschicht: VX1

Nr.	Tiefe m	Phi °	Theta °	Max-Wert nT	Max-Wert EMI µV	Magn. Moment Am ²	LSQ nT	Auto	Optimier-Bereich m ²	Rechtswert m	Hochwert m	Bemerkung
1	0,05	296	291	91		0,026	11,0	X	1,33	3537202,943	5395286,260	Schrott
2	3,12	198	17	65		28,239	4,6	X	4,72	3537208,035	5395293,942	Bushaltestelle
3	0,14	356	313	623		0,227	16,5	X	5,27	3537212,314	5395285,263	Schrott
4	1,55	155	61	52		2,229	5,3	X	8,09	3537210,435	5395296,444	Böschung Stein
5	0,08	70	65	42		0,017	2,0	X	0,45	3537218,853	5395278,457	Schrott
6	0,12	20	26	48		0,020	3,8	X	0,52	3537222,391	5395280,581	Schrott
7	0,12	61	292	106		0,056	5,3	X	0,73	3537216,064	5395297,648	Schrott
8	0,11	248	47	133		0,080	6,2	X	2,46	3537226,261	5395277,314	Schrott
9	0,09	239	62	41		0,017	2,5	X	0,42	3537228,981	5395271,328	Schrott
10	0,14	208	40	192		0,084	11,0	X	0,90	3537227,845	5395274,129	Munitionsschrott Splitter
11	0,02	310	325	2049		0,403	139,4	X	1,95	3537217,397	5395305,134	Schrott
12	0,04	331	355	147		0,017	8,2	X	0,19	3537217,792	5395306,764	Schrott
13	0,16	167	333	56		0,027	17,1	X	0,47	3537232,137	5395271,074	Schrott
14	0,00	156	22	475		0,068	85,6	X	0,14	3537217,995	5395307,057	Schrott
15	0,09	273	267	66		0,040	9,5	X	2,18	3537235,973	5395269,490	Schrott
16	1,75	340	189	61		4,936	2,7	X	2,44	3537222,627	5395312,632	Regenwasserkanal
17	0,00	327	43	141		0,013	9,7	X	0,10	3537242,927	5395264,899	Schrott
18	3,63	348	47	65		41,069	3,6	X	11,88	3537254,999	5395261,238	Zaun
19	2,55	18	0	60		10,257	3,4	X	7,22	3537257,545	5395260,844	Zaun
20	0,41	316	347	544		1,289	50,2	X	2,32	3537234,776	5395326,618	Schrott
21	1,94	21	341	61		7,823	3,1		30,69	3537222,361	5395312,535	Schrott
22	0,89	39	139	544		5,458	13,7		23,46	3537234,747	5395326,936	Schrott
23	0,25	294	33	31		0,049	2,1		39,05	3537227,386	5395292,350	Schrott
24	0,24	265	322	39		0,047	3,4		15,61	3537238,045	5395226,529	Asphalt keine Bergung
25	0,11	292	282	213		0,109	18,8		7,91	3537255,146	5395222,337	Asphalt keine Bergung
26	0,26	284	349	31		0,041	2,4		2,62	3537228,191	5395293,256	Schrott
27	0,22	86	291	34		0,037	1,6		6,81	3537217,521	5395294,213	Schrott
28	0,18	243	62	16		0,013	1,1		10,10	3537244,622	5395292,956	Schrott
29	0,18	68	20	20		0,019	1,9		3,27	3537243,314	5395225,196	Asphalt keine Bergung
30	0,19	247	340	21		0,016	1,4		5,36	3537254,122	5395294,602	Schrott
